


Hoe ziet de planning er uit?


We zijn op meerdere plekken in het gebied tegelijkertijd aan het werk. Waar we wanneer aan het werk zijn, ziet u in de tabel en op de kaart van het gebied. Deze planning is onder voorbehoud. De actuele planning vindt u op www.meanderendemaas.nl/uitvoering.

Planning uitvoering project Meanderende Maas

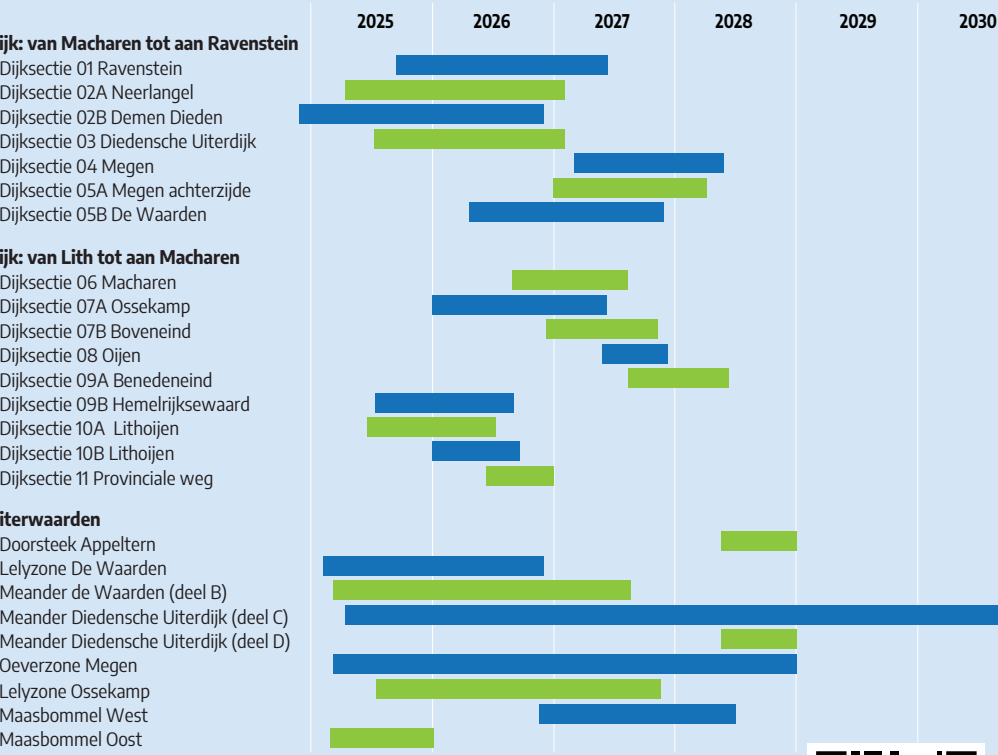

Volg de voortgang, het nieuws en download de Meanderende Maas app

Overzicht indeling werkgebieden langs de Maas

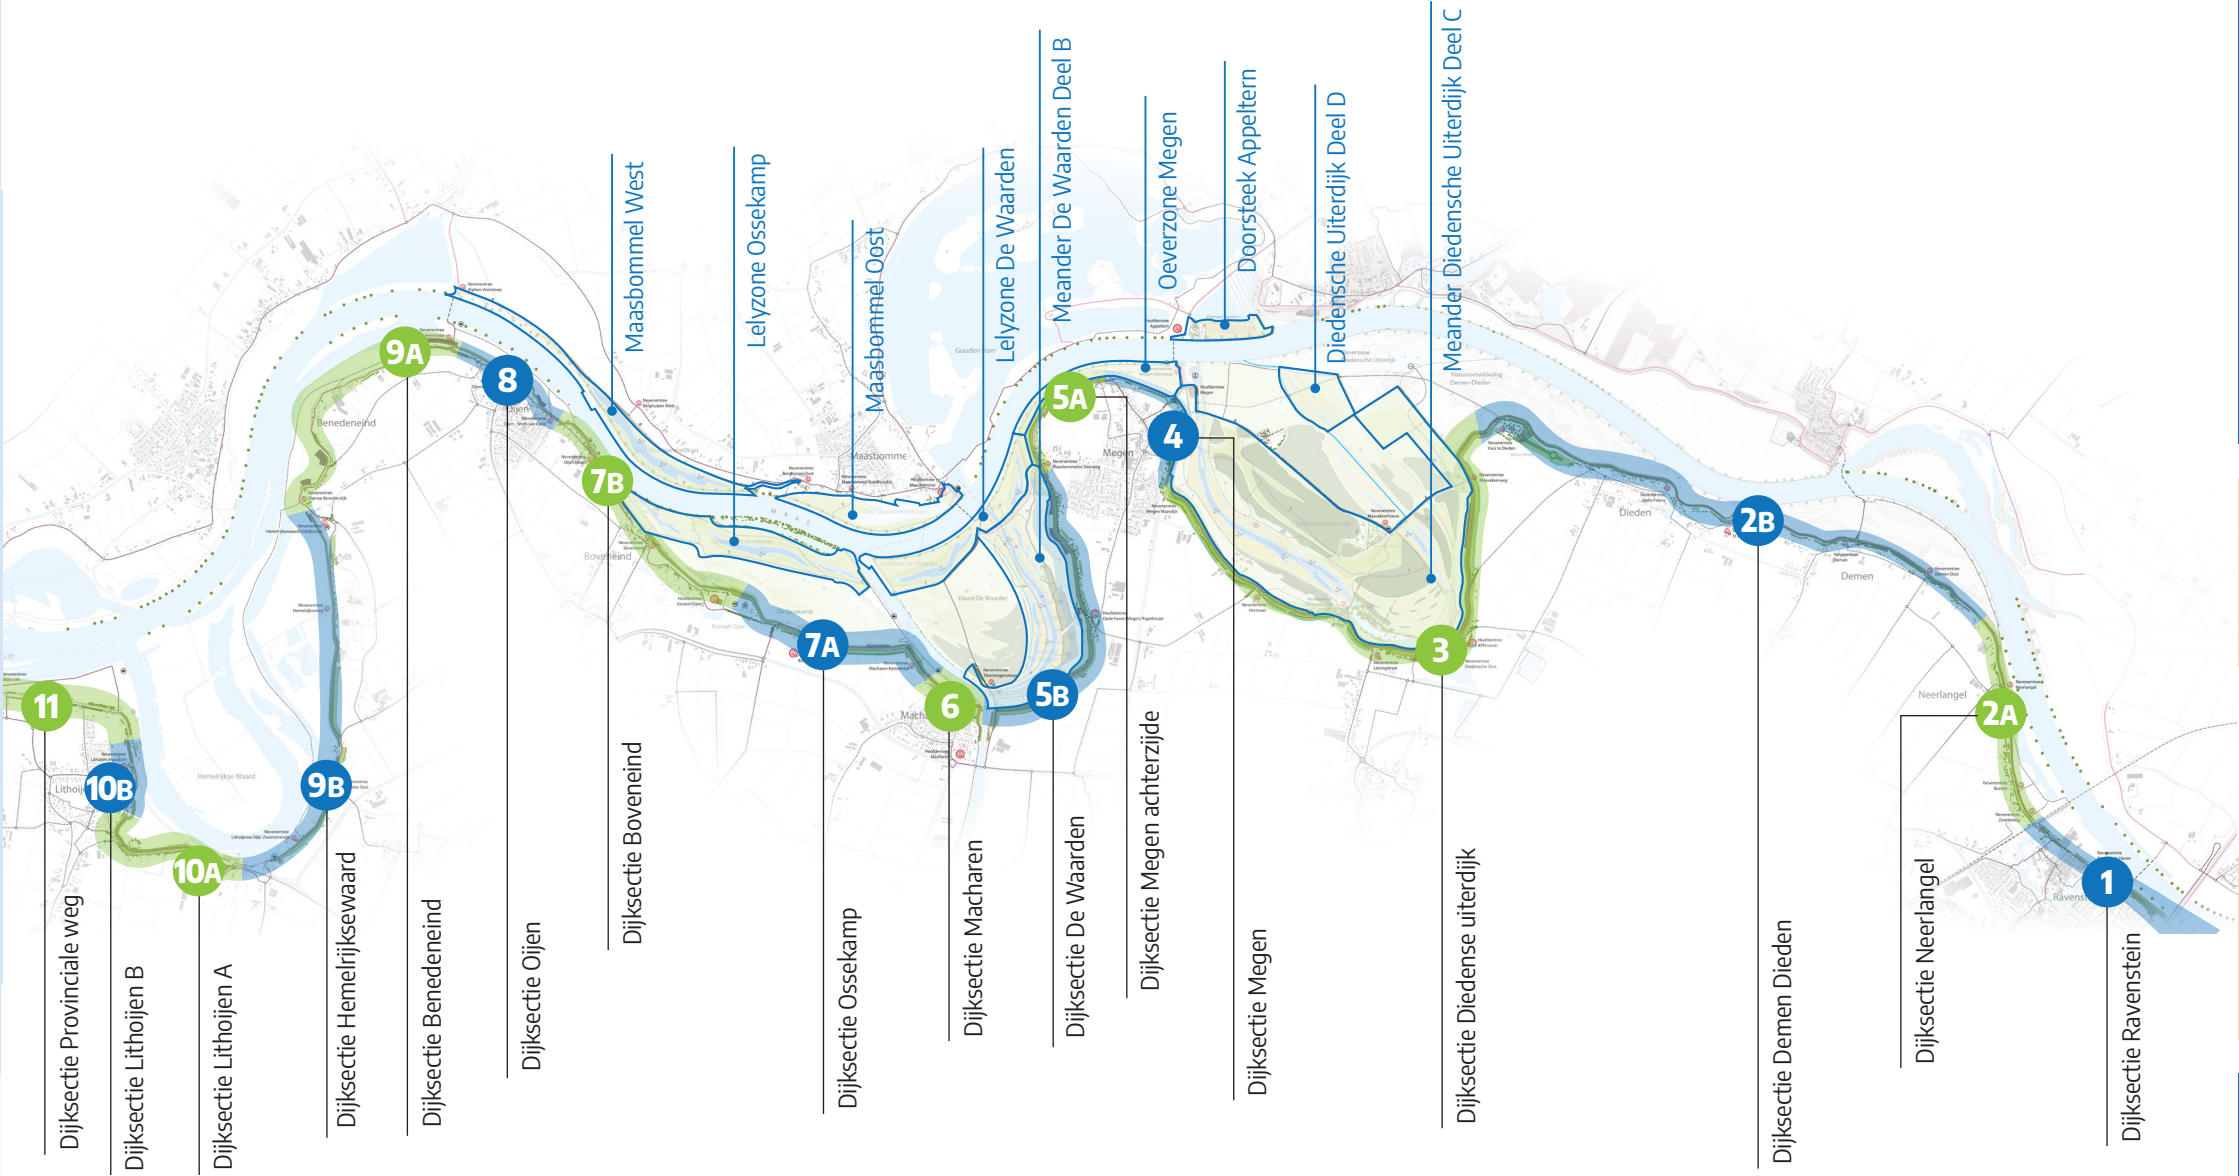

Het project in vogelvlucht

Meer ruimte voor mens, rivier en natuur



10A10B

Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot Lith versterken. We gaan de Maas aan de Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. Tien organisaties en aannemer Boskalis Nederland B.V. werken samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden aan de toekomst van het karakteristieke gebied rond de Maas. Met oog voor de bestaande kwaliteiten. Het resultaat is in 2030: een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur. Veilig en mooi.

Lengte dijk Ravenstein-Lith	375 ha nieuwe natuur =	Nieuwe fiets- en wandelpaden op de tuimeldijken*
26,6 km	750 voetbalvelden	6,5 km
Lengte Maastraject	Aantal bewoners, bedrijven en belanghebbenden langs de dijk	Struinpad in uiterwaarden
18 km	400	20 km
Nieuwe fietspaden	Aantal (voet) veren tussen Noord-Brabant en Gelderland	Grond nodig voor dijkversterking uit uiterwaarden
7,5 km	6	1 milj. m³

Planning

2023 Planuitwerking afgerond	2024 Start uitvoering	2028 Dijk gereed	2030 Werkzaamheden afgerond
---------------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------------

Dijksectie 10A en 10B

Wat gaan we doen?

Start

Inrichten van het bouwterrein

- Afrastering van het bouwterrein.



Voorbereiding transportroutes

- Inrichten van de laad- en loslocatie op een ponton. Materiaal wordt zoveel mogelijk via de Maas aan- en afgevoerd.
- Buitendijks (aan de rivierzijde) aanleggen van rijplaten om transport van het materiaal hierover te vervoeren in plaats van over de openbare weg.



Aanleg tijdelijke inritten

- Tijdelijke inritten voor bouwverkeer aanleggen voor het plaatsen van damwanden, kleitransport en grondwerk.
- De Lithoijense Dijk en het fietspad afsluiten tot aan het bord Lithoijen tijdens de werkzaamheden.
- Omleidingsroutes aanbrengen voor bereikbaarheid percelen van bedrijven en omwonenden.
- Tijdelijk verplaatsen bushalte Lithoijensdijk.



Verwijderen van fietspad en weg

- Tijdelijk verwijderen van het fietspad en de weg op de Lithoijense dijk.
- Omleidingen aangeven in de omgeving. (april 2025 t/m juni 2026)



Plaatsen van de damwand

- Aanbrengen van de stalen damwand, afhankelijk van de omgeving wordt er gekozen voor trillen of drukken. Bebouwing en ecologie zijn hierin leidend.
- De damwanden zijn circa 15 meter lang.
- Na het plaatsen vullen van de sleuf met klei.
- Plaatsen van keermuur ter hoogte van Maaszicht (10B).



Verstevigen, verhogen en verplaatsen van de dijk

- Verstevigen van de dijk met klei uit Megen en hergebruik van klei uit de huidige dijk.
- Verplaatsen van de dijk richting de Maas.
- Inklinken van de klei om de dijk zijn stevigheid te geven. Dit is een rustperiode voor de dijk (ca. 8 maanden).



Afbouw van de dijk

- Dijkvormen herstellen na rustperiode.
- Gras inzaaien voor versteviging.
- Bomen en hagen planten.
- Fietspad en weg op Lithoijense dijk opnieuw aanleggen.
- Bebording, meubilair en trappen plaatsen.
- Inritten naar percelen aanleggen.



Eind

Graven van sleuven voor de damwand

- Een sleuf graven ter voorbereiding op het plaatsen van de damwanden, waarin deze worden geplaatst.



Inrichten van het bouwterrein
januari t/m mei 2026

Voorbereiding transport routes
januari t/m mei 2026

Plaatsen van keermuur Maaszicht
februari t/m maart 2026

Aanleg tijdelijke inritten
april t/m mei 2026

Graven van sleuven voor damwand
februari t/m juli 2026

Plaatsen van de damwand
februari t/m juli 2026

Dijken verstevigen, verhogen, verplaatsen
mei t/m juli 2026

Afbouw van de dijk
juni t/m september 2026

Inrichten van het bouwterrein
april t/m mei 2025

Voorbereiding transport routes
april t/m mei 2025

Aanleg tijdelijke inritten
april t/m mei 2025

Verwijderen van fietspad en weg
augustus t/m oktober 2025

Graven van sleuven voor damwand
mei t/m oktober 2025

Plaatsen van de damwand
mei t/m november 2025

Dijken verstevigen, verhogen, verplaatsen
augustus t/m oktober 2025

Afbouw van de dijk
oktober 2025 t/m mei 2026

De werkzaamheden aan de dijk zijn opgedeeld in twee delen. De periodes geven aan vanaf welke maand de werkzaamheden starten. De planning is een indicatie. De meest actuele planning en updates kunt u vinden op www.meanderendemaas.nl/uitvoering
